

庁舎整備だより 第31号

庁舎整備推進室
☎(63)2481

工事の進捗について

新庁舎建設工事は現在、行政棟（Ⅱ期工事）および、行政棟と議会棟を結ぶ接続廊下の建設を行っており、令和5年2月の引き渡しを目指して順調に進んでいます。

今後は建物建設工事と合わせて外構工事も進め、5月大型連休後の完全開庁を予定しています。

●建設現場の様子（8月現在）

工事現場では、令和4年3月から開始した鉄骨工事が進み、外観の全体像が見えてきました。内部では鉄骨を耐火塗装した後、床や壁、窓の取り付け作業を行っています。



外観



内部


工事内容の一部を変更しています

新庁舎整備建設工事は、市議会の議決を経て、内容を変更しています。

	当初	第1回変更	第2回変更
契約日（議決日）	令和2年1月29日	令和3年3月19日	令和4年6月20日
契約金額（税込）	5,519,800,000円	5,601,959,000円	5,874,594,000円

当初契約からの主な変更内容については、以下の通りです。

- 工事全体 … 社会情勢に伴う物価上昇分の増額
- 建物工事 … 防火性能向上（防火区画の変更・防火仕様建具の追加）、建物を地中で支える杭長の変更、入退出管理セキュリティシステムの導入、行政棟東入口付近に大型扉の取付、議場に飛沫防止板の取付、秘書課エリアのトイレ設置
- 外構工事 … 議会棟よう壁の補強・進入路の拡張、文化財発掘調査に伴う地盤改良、駐車場舗装の見直し、旧庁舎正面ロビーの壁画移設
- 解体工事 … アスベスト調査・処分の追加、地中コンクリートの撤去

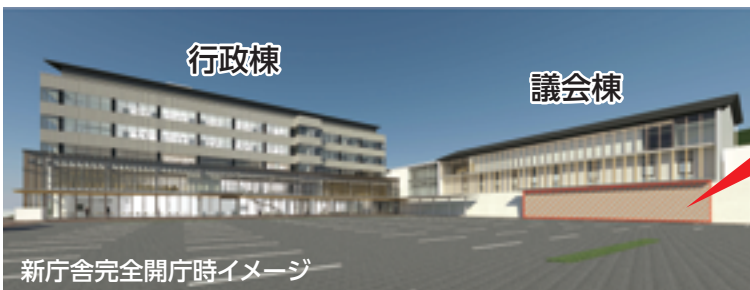

行政棟

議会棟

新庁舎完全開庁時イメージ

旧庁舎正面ロビーの壁面に設置していた壁画を移設します。



（昭和33年旧庁舎竣工時 撮影）
